

PLANO DE MONETIZAÇÃO E IMPLEMENTAÇÃO

Plano de Monetização Integrado — RG Maintenance

Versão 1.0 — 2026-06-12

● Aguarda aprovação do Rui

Plano de Monetização Integrado — RG

Maintenance

Do Catálogo ao Primeiro Cliente Pago — Roadmap de Execução

Resumo Executivo (30 segundos)

- **O quê:** este plano transforma o catálogo de preços e a visão de monetização já definidos em *04 - Monetização* num **roadmap de execução concreto** — que ações administrativas, técnicas e comerciais são precisas, por quem, e quando, para passar de "0 clientes" a "primeiro cliente pago" e manter a operação legal/fiscal em ordem ao longo do caminho.
- **Quem aparece / quem está envolvido:** o Rui é o rosto comercial junto da sua rede de contactos (Canal 1 de *04 - Monetização*) — é o único produto/projeto do Rui onde há presença pessoal estruturalmente necessária (venda B2B a empresas de manutenção/facilities requer confiança/relação). Claude trata de tudo o resto: código, conteúdos, configuração de plataformas, materiais de venda.
- **Quem executa:** Claude (desenvolvimento do produto, conforme *01 - Plano de Implementação* e *02 - Cronograma*) + automações já existentes, nos turnos noturnos (00h-07h, AG-07).
- **O que o Rui faz:** aprova este plano + executa ~9 ações pontuais (a maioria administrativas, ~15-20 min cada) distribuídas ao longo das Fases já existentes, mais o esforço comercial do Canal 1 (fora do âmbito deste plano — é trabalho de negócio do Rui, não de Claude). Tempo total estimado de ações **novas** introduzidas por este plano: **~3h** (ver secção 8).
- **Resultado (Ano 1):** produto em produção (Fase 7 concluída), catálogo SaaS publicado (Starter/Pro/Business/Enterprise), faturação automatizada via Stripe operacional, e cenário conservador de **~10 clientes Pro pagos aos 6 meses** (~290€/mês de MRR), conforme já projetado em *04 - Monetização*.
- **Próximo passo:** o Rui aprova este documento → Claude regista a aprovação em *Log de Decisões* e integra os checkpoints financeiros (secção 5) no cronograma técnico já em curso (Fase 1, em curso esta semana).

1. Porquê este plano

04 - Monetização já define **o quê vender** (4 planos SaaS, 29-199€/mês), **a quem** (indústria, hotelaria, facilities, construção, hospitais, câmaras), **como adquirir clientes** (4 canais) e **projeções de receita** (450€/mês conservador aos 6 meses). Esse documento mantém-se válido na íntegra como catálogo e visão de negócio — **não é repetido aqui**.

O que faltava era ligar essa visão ao que está a acontecer agora no projeto:

- O *02 - Cronograma* mostra que o projeto está na **Fase 1 (Setup & Base)**, com a Fase 7 ("SaaS & Lançamento", onde entra Stripe + onboarding de clientes) prevista só para a Sem. 10-12. Sem coordenação, há o risco de chegar à Fase 7 sem a parte administrativa/fiscal pronta (atividade aberta nas Finanças, conta Stripe configurada), o que atrasaria o "primeiro cliente externo" — exatamente o gate A7b.
- Existe agora um **Estudo Financeiro partilhado** entre todos os projetos do Rui (G:_CLAUDE 2026\00. TEMPLATES\Estudo-Financeiro-Portugal-Digital.md, concluído 2026-06-12) que sistematiza os passos legais/fiscais por marco de receita — este plano traduz esses marcos para o calendário concreto do RG Maintenance (secção 5).
- O padrão "Plano de Monetização e Implementação Integrado" foi aprovado pelo Rui para o EneaSpirit (v1, 2026-06-11) como formato reutilizável **"para qualquer um dos seus projetos"** — este é a primeira aplicação desse formato ao RG Maintenance.

O que se mantém válido e não é repetido:

- *04 - Monetização* — planos e preços, projeções, concorrência, canais de aquisição, KPIs, roadmap v2.0.
- *01 - Plano de Implementação* e *02 - Cronograma* — as 7 fases técnicas, gates A0-A7b, semanas 1-12. Este plano **não cria um cronograma paralelo**; integra-se no já existente.

3. Catálogo de Produtos / Ofertas

3.1 Tipos de produto/oferta

#	Produto/Oferta	Formato	Preço	Quem produz	Envolvimento do Rui
1	Plano Starter	SaaS, subscrição mensal (grátis)	0€	Claude (produto já especificado)	Nenhum — self-service
2	Plano Pro ★	SaaS, subscrição mensal	29€/mês	Claude	Nenhum — self-service via Stripe
3	Plano Business	SaaS, subscrição mensal	79€/mês	Claude	Nenhum — self-service via Stripe
4	Plano Enterprise	SaaS + onboarding assistido + formação	199€ +/mês	Claude (produto) + Rui (onboarding/formação)	Alto — única oferta com serviço presencial/remoto incluído
5	Programa de Parcerias (revenda)	Comissão 20% para empresas de manutenção industrial	—	Claude (materiais de parceiro)	Médio — negociação inicial de cada parceiro (Canal 4, meses 6+)


Tabela completa de planos/preços/funcionalidades já existe em *04 - Monetização* ("Planos e Preços") — não

repetida aqui.

3.2 Catálogo detalhado — Produto ↔ Fase de desenvolvimento ↔ Pré-requisito de venda

Produto	Depende de (fase técnica)	Pré-requisito comercial/legal	Pode vender a partir de
Starter (grátis)	Fase 2 (Autenticação multi-tenant) concluída	Nenhum — não gera faturação	Fase 2 (lead magnet / trial)
Pro / Business	Fase 3-6 concluídas (Dashboard + PWA + PDF/Diário + Testes)	Atividade independente aberta + Stripe configurado (ver secção 5)	Fase 7 (gate A7a)
Enterprise	Fase 6 concluída + capacidade de onboarding/formação	Idem Pro/Business + disponibilidade do Rui para onboarding	Fase 7, após primeiros clientes Pro validados
Programa de Parcerias	Produto estável (pós-Fase 7)	Contrato/acordo de comissão por parceiro	Mês 6+ (conforme Canal 4 de 04 - Monetização)

4. Funil de Monetização Integrado

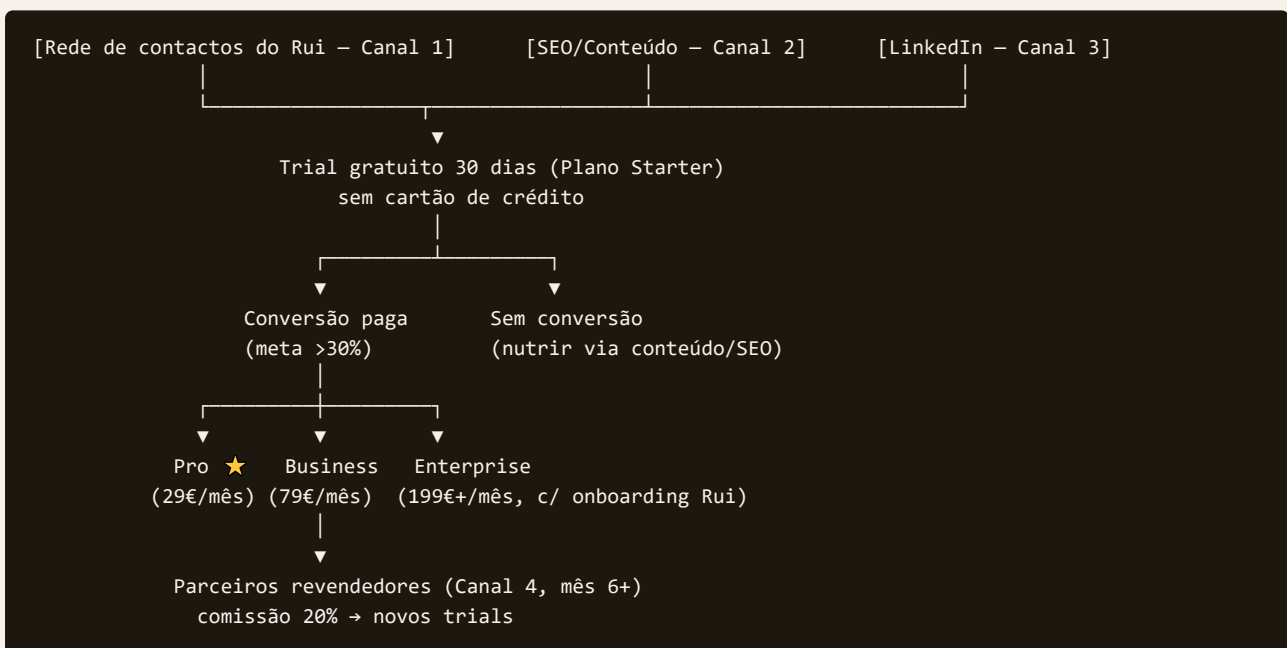

Este funil é o mesmo já descrito nos "Canais de Aquisição" de 04 - Monetização — a novidade deste plano é **ligar a entrada no funil (trial) à infraestrutura de cobrança (secção 5)**: o trial de 30 dias sem cartão só é credível se, no fim desses 30 dias, existir um checkout Stripe funcional para converter — daí a importância de ter a Fase 7 e o checkpoint financeiro #6 (secção 5) alinhados.

5. Financeiro — Faturação, Impostos e Plataformas de Pagamento

Resumo, não duplicação — fonte completa: G:_CLAUDE 2026\00. TEMPLATES\Estudo-Financeiro-Portugal-Digital.md (documento partilhado entre todos os projetos do Rui — EneaSpirit, RG Maintenance, FinBot, FWG). Esta secção resume os pontos relevantes para o RG Maintenance e liga-os ao cronograma técnico de 02 - *Cronograma* como **checkpoints transversais de custo-zero de tempo de Claude** — ações administrativas pontuais do Rui (~15-20 min cada, na maioria gratuitas) que precisam de acontecer antes de certos marcos de receita, sem consumir noites AG-07 de desenvolvimento.

5.1 Marcos de Receita Relevantes para o RG Maintenance

#	Marco	Ação (ver Estudo Financeiro secção 7)	Quando no RG Maintenance
1	Antes da 1ª venda (€0)	Abrir atividade independente nas Finanças (gratuito, ~15 min online), código de atividade "outras prestações de serviços" (coeficiente 0,35)	Antes do gate A7a (Stripe + 1ª subscrição de teste) — pode ser feito em paralelo com qualquer fase anterior, sem pressa
2	Confirmar isenção de IVA (art. 53º)	Isenção até €15.000/ano — não cobrar IVA enquanto faturação ≤ esse valor. No cenário conservador (~450€/mês ≈ 5.400€/ano), o RG Maintenance fica confortavelmente dentro da isenção no Ano 1	Confirmar no mesmo passo do marco 1
3	Confirmar regime simplificado de IRS	Coeficiente 0,35 , reduzido a 0,175 no 1º ano (50%) — relevante para o cálculo de margem das projeções (secção 10)	Confirmar no mesmo passo do marco 1
4	Isenção de Segurança Social — primeiros 12 meses	Automática, sem pedido, se for a 1ª vez (sem atividade independente nos últimos 3 anos)	A partir da abertura de atividade (marco 1)
5	1ª venda realizada (1º cliente Pro pago)	Emitir 1ª fatura via Recibos Verdes (Portal das Finanças, gratuito); confirmar que não há retenção na fonte (clientes B2B portugueses sem contabilidade organizada / clientes via Stripe internacional, geralmente sem retenção)	Gate A7b — primeiro cliente externo
6	Receita mensal recorrente (várias subscrições/mês via Stripe)	Migrar de Recibos Verdes manuais para software de faturação certificado integrado com Stripe — recomendação: InvoiceXpress (pay-per-document)	A partir de ~5-10 clientes Pro ativos (cenário conservador de 04 - <i>Monetização</i> , ~6 meses)
7	Faturação a aproximar-se de €15.000/ano	Monitorizar total faturado; planejar regime normal de IVA + avaliar OSS se houver clientes B2C noutros países da UE	Só relevante se o cenário médio/otimista de 04 - <i>Monetização</i> (1.900-4.720€/mês) se concretizar — vigilância a partir do cenário médio (12 meses)
8	Faturação ultrapassa €15.000/ano	Regime normal de IVA (23%) + OSS + Stripe Tax	Condicional — só no cenário otimista do Ano 2

#	Marco	Ação (ver Estudo Financeiro secção 7)	Quando no RG Maintenance
9	Fim do 1º ano de atividade	Termina isenção de SS; coeficiente IRS passa de redução 50% para 25%	Marco de calendário a partir da data de abertura (marco 1) — bom momento para revisão de margens face às projeções da secção 10

Marcos adicionais (3º ano, limiar €29.748, transição para ENI/Lda) — ver Estudo Financeiro secções 6-7, não relevantes no horizonte deste plano (Ano 1).

5.2 Plataformas — Recomendação para o RG Maintenance

Conforme Estudo Financeiro secção 5.1, e alinhado com a stack já definida em *03 - Ferramentas & Stack* (Stripe já listado como "Pagamentos SaaS — só na Fase 7"):

- **Stripe** confirma-se como a plataforma de cobrança correta — suporta subscrições recorrentes (essencial para o modelo SaaS mensal Starter/Pro/Business/Enterprise), comissões competitivas, e caminho natural para Stripe Tax se/quando o RG Maintenance sair da isenção de IVA (marco 8, cenário otimista Ano 2).
- **InvoiceXpress** como software de faturação a integrar com Stripe **quando o volume se tornar recorrente** (marco 6 — coincide com ~5-10 clientes Pro ativos). Até esse ponto, **Recibos Verdes manuais** (gratuitos) são suficientes — a baixa frequência inicial (poucos clientes nos primeiros meses) não justifica o custo/setup do InvoiceXpress desde o dia 1.
- **MB WAY** — não prioritário: o público-alvo do RG Maintenance é B2B (empresas que pagam por cartão/transferência via Stripe Checkout), pelo que o checkout Stripe padrão é suficiente.
- **Hotmart/Kiwify** — não aplicáveis a este projeto (modelo de subscrição B2B SaaS, não produtos digitais avulsos/lusófonos).

5.3 Integração no Cronograma — Checkpoints Transversais

Os 9 marcos acima **não são fases novas** nem alteram *02 - Cronograma* — são checkpoints administrativos pontuais (cada um ~15-20 min, maioria gratuitos) que o Rui pode fazer em paralelo com qualquer fase técnica em curso. Ver secção 7 para os pontos exatos de inserção (marcados com ).

6. Plataformas / Canais de Venda

Plataforma/Canal	Para quê	Porquê (encaixa no modelo)	Ação única do Rui
Stripe Checkout	Cobrança de subscrições Pro/Business/Enterprise	Suporta planos recorrentes, integra com Next.js/Vercel já usados	Criar conta Stripe (gratuita) — checkpoint  #1, secção 7

Plataforma/Canal	Para quê	Porquê (encaixa no modelo)	Ação única do Rui
Landing page (Vercel, já no stack)	Apresentação do produto + início de trial	Já incluído na Fase 7 de <i>01 - Plano de Implementação</i>	Nenhuma — Claude implementa
LinkedIn (perfil do Rui)	Canal 3 de <i>04 - Monetização</i> — casos de sucesso, demos	Audiência B2B (gestores de facilities/manutenção) já alinhada com o público-alvo	Publicar/partilhar conteúdos preparados por Claude (~15 min/semana, a partir da Fase 7)
Rede de contactos direta (Canal 1)	Primeiros 5 clientes	É o único canal que requer presença pessoal do Rui — relação de confiança B2B	Esforço comercial do Rui (fora do âmbito de tempo deste plano — ver nota na secção 8)
Parceiros revendedores (Canal 4)	Distribuição via empresas de manutenção industrial	Comissão 20% já definida em <i>04 - Monetização</i>	Negociação inicial por parceiro (mês 6+, fora do âmbito imediato)

7. Cronograma — Checkpoints Financeiros Integrados em 02 - Cronograma

Este plano **não introduz um cronograma paralelo**. *02 - Cronograma* já define as 7 fases técnicas (Sem. 1-12) e os gates A0-A7b. A tabela abaixo mostra **apenas os checkpoints novos** (📅, administrativos, do Rui) a inserir nesse cronograma já existente — sem consumir noites AG-07 de Claude.

Checkpoint	Marco financeiro (secção 5.1)	Quando inserir	Tempo Rui	Bloqueia alguma fase?
📅 #1	Abrir atividade independente + confirmar isenção IVA/IRS/SS (marcos 1-4)	Pode ser feito desde já, em paralelo com a Fase 1 (em curso) — sem pressa, mas recomenda-se concluir antes do gate A7a	~15 min	Não bloqueia Fases 1-6; bloqueia gate A7a se não estiver feito
📅 #2	Criar conta Stripe (gratuita)	Em paralelo com a Fase 6 (Testes & Polimento, Sem. 9-10) — antes do início da Fase 7	~10 min	Bloqueia gate A7a se não existir
📅 #3	1ª fatura via Recibos Verdes (marco 5)	No momento do gate A7b (primeiro cliente externo)	~10 min	Não bloqueia — é consequência do gate, não pré-requisito
📅 #4	Avaliar migração para InvoiceXpress (marco 6)	Após atingir ~5-10 clientes Pro ativos (pós-lançamento, fora da janela de 12 semanas)	~20 min (decisão + configuração inicial)	Não bloqueia — melhoria operacional

Nota sobre contenção: estes 4 checkpoints somam **~55 min pontuais** do Rui, distribuídos ao longo de ~10 semanas já planeadas — não introduzem nenhuma noite AG-07 adicional de Claude além do

que já está em 02 - *Cronograma* para a Fase 7 (integração Stripe, que já estava prevista).

8. O Que o Rui Precisa de Fazer (Total: ~3h, distribuído ao longo das Fases 1-7)

#	Ação	Quando	Tempo	Tipo
1	Aprovar este plano	Agora	5 min	Decisão
2	 Abrir atividade independente nas Finanças + confirmar isenções IVA/IRS/SS (checkpoint #1)	Em paralelo com Fase 1 (sem pressa, antes do gate A7a)	15 min	Ação única
3	 Criar conta Stripe (gratuita) (checkpoint #2)	Antes do início da Fase 7 (em paralelo com Fase 6)	10 min	Ação única
4	Decisão #003 já pendente: domínio, lançamento interno vs SaaS desde o início, nº técnicos previstos (já registada em <i>Log de Decisões</i> — não duplicada, apenas lembrada aqui por afetar o catálogo de venda da secção 3)	Não bloqueia Fases 1-6; recomenda-se antes da Fase 7	já registada — só responder	Decisão
5	 1ª fatura via Recibos Verdes (checkpoint #3)	No gate A7b (primeiro cliente externo)	10 min	Ação única
Subtotal pontual (ações novas deste plano)			~30 min	
6	Esforço comercial do Canal 1 (rede de contactos — primeiros 5 clientes)	Meses 1-3, conforme 04 - <i>Monetização</i>	Variável — esforço de negócio do Rui, não contabilizado em "noites AG-07" porque não é trabalho de Claude	Rotina (negócio)
7	Revisão do Check-in Semanal já existente (<i>Templates/Check-in Semanal</i>)	Semanal, a partir da Fase 1	~15 min/semana	Rotina (já existente, não criada por este plano)
Subtotal rotina (já existente, apenas referenciado)			~15 min/semana	

Nota: o "Subtotal pontual" reflete apenas as ações **administrativas/fiscais novas** que este plano introduz (~30 min). A ação #6 (esforço comercial do Canal 1) é trabalho de negócio do Rui já previsto em 04 - *Monetização* — incluída aqui por completude, mas sem estimativa de tempo porque não é executável por Claude nem substituível por automação.

9. Riscos e Mitigações

Risco	Mitigação
Chegar ao gate A7a (Stripe + 1ª subscrição) sem a atividade independente aberta nas Finanças, bloqueando a emissão da 1ª fatura ao primeiro cliente	Checkpoint  #1 (secção 7) recomendado em paralelo com a Fase 1, muito antes de ser necessário — gratuito e demora 15 min, sem custo de oportunidade
Cenário SaaS multi-tenant implica que dados de clientes diferentes (potencialmente concorrentes entre si — ex. duas empresas de facilities) partilham a mesma base de dados	02 - <i>Cronograma</i> já especifica RLS (Row Level Security) por <code>company_id</code> — este plano não altera essa arquitetura, apenas confirma que é o controlo correto antes de aceitar o 1º cliente pago externo (gate A2 já testa isolamento de dados)
Plano Enterprise (199€+) inclui "formação" e "suporte dedicado" — única oferta com componente presencial/serviço do Rui; risco de sobrecarregar o Rui se houver vários clientes Enterprise simultâneos antes de haver capacidade	Não vender Enterprise ativamente até existirem ≥2-3 clientes Pro/Business estáveis e validados (sequência natural do funil, secção 4) — Enterprise é "upsell" pós-validação, não foco do lançamento inicial
Cenário otimista de 04 - <i>Monetização</i> (4.720€/mês aos 18 meses) ultrapassaria o limiar de isenção de IVA (€15.000/ano) durante o Ano 2	Checkpoint financeiro #7-8 (secção 5.1) já identifica este marco como "vigilância a partir do cenário médio" — ação só necessária se a receita real se aproximar desse cenário, sem custo antecipado
Concorrência (Limble, UpKeep, Fractal) com produtos maduros — risco de feature gap percebido	Já mitigado pela proposta de valor de 04 - <i>Monetização</i> (preço 5x mais baixo + PT + suporte local); este plano não altera essa estratégia, apenas garante que a parte de cobrança/legal não é o gargalo quando a proposta de valor já está pronta

10. Projeções de Receita

As projeções de receita (cenários Conservador/Médio/Otimista, tabela completa com clientes Pro/Business/Enterprise por prazo) já estão definidas em 04 - *Monetização* ("Projeções de Receita") e **não são repetidas nem alteradas aqui** — este plano não introduz novos números, só confirma a sua viabilidade fiscal:

Cenário (04 - <i>Monetização</i>)	Receita/mês	Implicação fiscal (Estudo Financeiro)
Conservador (6 meses)	~450€/mês (~5.400€/ano)	Dentro da isenção de IVA (€15.000/ano) — regime simplificado IRS com redução de 50% no Ano 1 aplica-se integralmente
Médio (12 meses)	~1.900€/mês (~22.800€/ano)	Ultrapassa €15.000/ano — gatilho para checkpoint #7/8 (regime normal de IVA + possível OSS), a confirmar com TOC quando este cenário se aproximar
Otimista (18 meses)	~4.720€/mês (~56.640€/ano)	Bem acima do limiar de isenção — nesta fase, avaliar com TOC transição para ENI/Lda (Estudo Financeiro secção 6), conforme volume e necessidade de proteção patrimonial

Nota de conservadorismo: tal como já assumido em *04 - Monetização*, o cenário Conservador é o que orienta a decisão sobre o checkpoint #1 (abrir atividade) — mesmo nesse cenário, a isenção de IVA cobre confortavelmente o Ano 1, pelo que **não há urgência fiscal** em abrir a atividade antes do gate A7a, apenas conveniência (evitar bloqueio no momento da 1ª venda).

11. Próximo Passo

1. O Rui aprova este documento (ação #1 da secção 8).
2. Claude regista a aprovação em *Log de Decisões* (nova entrada, tipo "Aprovação de plano") e integra os 4 checkpoints financeiros da secção 7 como notas no *02 - Cronograma* (sem alterar a estrutura de fases/gates já existente).
3. O checkpoint  #1 (abrir atividade independente) pode ser feito pelo Rui em qualquer momento a partir de agora, em paralelo com a Fase 1 em curso — sem necessidade de aguardar qualquer gate.

v1.0 — 2026-06-12. Primeiro plano de monetização e implementação integrado do RG Maintenance — traduz o catálogo já definido em 04 - Monetização num roadmap de execução coordenado com 02 - Cronograma e com o Estudo Financeiro partilhado. Aguarda aprovação.
